
SAE 205 - GESTION DE PROJET

Organisation d'une Journée Universitaire

"Le numérique responsable c'est pas du gâteau"

Binome : Yvon & Achour Hamou Yahia

BUT Informatique - IUT

Année universitaire 2025-2026



1. Cadrage du projet et compréhension du cas

L'IUT veut organiser une journée universitaire dédiée au numérique responsable, un sujet de plus en plus important dans la formation des étudiants en informatique. La Direction voudrait que cet événement soit plus visible, crédible et conforme aux valeurs de l'IUT, sans non plus mobiliser trop de ressources.

En tant que chef de projet, notre rôle n'est pas d'exécuter les tâches nous-mêmes, mais d'organiser, et planifier l'ensemble de l'événement. Ce positionnement est important à comprendre dès le début puisque nous n'avons aucune autorité hiérarchique directe sur les services ou les intervenants. Nous devons donc piloter par la parole, en montrant à chaque acteur ce qu'on attend de lui et à quel moment.

Le projet repose sur trois contraintes majeures et non négociables :

- Le délai : la journée doit impérativement se tenir le jeudi 14 mai, date qui a été fixée par la Direction pour des raisons institutionnelles et de disponibilité d'espaces.
- Le coût : le budget total est de 2 000 euros, à ne pas dépasser.
- La qualité : l'événement doit être crédible et visible, tant en interne qu'en externe.

Ces trois contraintes forment le triangle de gestion du projet classique, et toutes les décisions que nous avons prises au cours de ce projet s'appuient sur celui-ci. Dès que l'une d'elles était menacée, nous avons dû prendre des décisions. Par exemple, ajouter de la restauration aurait amélioré l'accueil du public mais aurait dépassé le budget, on a donc choisi de l'exclure du périmètre.

2. Analyse des besoins et du périmètre du projet

Les besoins identifiés

Deux besoins principaux ont été identifiés à partir de ce sujet :

- D'abord un besoin pédagogique qui va permettre aux étudiants d'acquérir des connaissances concrètes sur les enjeux du numérique responsable, à travers des ateliers et des conférences.
- Ensuite un besoin institutionnel pour montrer que l'IUT affirme une position logique sur ce sujet et s'engage activement, pour renforcer son image et sa cohérence avec ses valeurs.

Ces deux besoins vont l'une avec l'autre mais peuvent parfois entrer en conflit. Par exemple, un grand amphithéâtre avec un seul intervenant répond mieux au besoin pour faire de la visibilité, mais un format avec des petits ateliers répond mieux au besoin pédagogique. Nous avons donc fait le choix de privilégier des ateliers participatifs et ludiques, tout en préparant une ouverture officielle en présence de la Direction pour répondre aux deux dimensions.

Le périmètre : ce qui est inclus et ce qui est exclu

Pour gérer les attentes dès le départ, nous avons défini explicitement ce qui entre dans le périmètre du projet et ce qui est exclu. Ce travail de délimitation est très important car il nous a permis d'éviter des problèmes budgétaires et de concentrer nos efforts sur l'essentiel.

Ce qui est dans notre périmètre :

- Choisir et inviter des intervenants (INR, Fresque du Numérique, enseignants)
- Réservation des salles et du matériel audiovisuel au sein de l'établissement
- Création et diffusion des supports de communication
- Coordination des différents services de l'IUT
- Accueil et sécurité le jour J

Ce qui est hors périmètre et pourquoi :

- Il n'y aura pas de restauration puisque le budget de 2 000 euros ne permet pas de proposer un repas sans réduire le matériel important comme le matériel ou la sécurité. Ce choix est complètement assumé.
- Il n'y aura pas non plus de salles extérieures à l'IUT parce que louer une salle externe signifierait des coûts supplémentaires et des contraintes logistiques qui ne vont pas avec notre budget et notre délai.
- Pas d'événement avant ou après le 14 mai pour être sûr de la disponibilité des espaces et éviter la fatigue organisationnelle.
- Et pas d'ouverture au public, évidemment car l'événement cible prioritairement les étudiants de l'IUT avec une ouverture possible à d'autres publics universitaires.

3. Objectifs du projet et livrables attendus

Objectif principal

L'Objectif est de réunir les étudiants et les membres de l'IUT le jeudi 14 mai pour assister à une journée de sensibilisation au numérique responsable, organisée et coordonnée par notre équipe projet.

Objectifs secondaires

- Il faudra mettre en avant l'IUT grâce à une communication soignée et la présence d'intervenants crédibles pour renforcer l'image de l'établissement.
 - On devra respecter les contraintes imposées par l'administration avec notre budget de 2000 euros et la date du 14 mai.
 - Et garantir la qualité de l'événement pour que le public en garde de bon souvenir et que la Direction soit satisfaite du résultats
-

Livrables concrets

- Un programme détaillé de la journée
 - Des supports de communication validé et qui soit diffusé
 - Des intervenants confirmés et prêt
 - Un bilan financier en fin de projet
 - Une journée qui se déroule sans soucis le 14 mai
-

4. Acteurs du projet, organisation et gouvernance

Les acteurs identifiés

Pendant l'analyse de base du sujet, plusieurs acteurs identifiés ont été incontournables. Que ce soit leur rôle, leur niveau d'engagement et leurs contraintes. Elles ont toute été prise en compte pour définir notre organisation.

Acteur	Rôle projet	Contraintes / Remarques
Directeur IUT	MOA (client)	Valide le positionnement et le rendu final
Service logistique	MOE	Disponibilité des salles selon format retenu
Equipe projet (binôme)	Chef de projet	Aucune autorité hiérarchique directe
Service communication	Acteur contributeur	Charte graphique à respecter, délais de validation
Enseignants	Intervenants internes	Disponibilités incertaines selon obligations pédagogiques
INR	Intervenant externe	Intervient généralement gratuitement dans les IUT publics
Fresque du Numérique	Intervenant externe	Gratuit ou frais de participation de 100 à 200 euros
Association étudiante	Mobilisation	Engagement base sur le bénévolat, contraintes calendrier

Gouvernance : piloter sans autorité hiérarchique

Un des points les plus importants de ce projet est que nous n'avons aucun pouvoir réel sur les services ou les intervenants. On ne peut pas ordonner quoi que ce soit mais seulement convaincre et coordonner.

Concrètement, ça signifie que nous devons agir comme des chefs d'orchestre : définir le rôle attendu de chaque acteur, lui montrer à quel moment il intervient. La matrice RACI présentée a été un outil très utile pour remarquer ces attentes et gérer notre coordination.

La validation finale revient donc au Directeur de l'IUT, et les livrables intermédiaires sont validés par les services logistique et communication. Ces validation sont très importantes à respecter si nous voulons éviter tout blocage de dernière minute.

Planification de la journée :

EMPLOI DU TEMPS DE L'ÉVÉNEMENT

JOURNÉE UNIVERSITAIRE SUR LE NUMÉRIQUE RESPONSABLE

9h00 - 9h30	INTRODUCTION Accueil & Mot de bienvenue
9h30 - 11h30	PARTIE THÉORIQUE EXPLICATIVE Conférences éco-responsables & enjeux du numérique
11h30 - 13h00	PAUSE
13h00 - 14h45	ACTIVITÉS POUR LA PRATIQUE Ateliers interactifs & mise en pratique
14h45 - 15h30	QUIZ AVEC LOTS À GAGNER Quiz avec remise des prix
15h30 - 16h00	CONCLUSION Bilan, Remerciements & Clôture de la journée



JEUDI 14 MAI

5. Répartition des rôles et responsabilités (RACI)

La matrice RACI nous a permis de voir qui fait quoi, et qui valide quoi. Sachant que nous n'avons pas d'autorité directe, il permet d'officialiser les responsabilités de chacun et nous donne une meilleure coordination.

Legende : R = Réalisateur | A = Approbateur C = Consulte I = Informe

Tâche / Livrable	Equipe projet	Direction IUT	Servi. Com & Logistique	Intervenants Ext.	Association Etud.
Respect du budget	R	A	I	I	I
Création de la communication	R	I	A/C	I	I
Réservation logistique	R	I	A/C	I	I
Recherche intervenants	A	I	R	C	I
Mobilisation du public	A	I	I	I	R
Animation le jour J	A	I	I	R	I
Validation finale	C	A/R	C	I	I

On porte la responsabilité opérationnelle sur la grande majorité des tâches, mais l'approbation reste très souvent dans les mains de la Direction ou des services. C'est normal avec notre positionnement. La colonne association étudiante est importante avec la mobilisation du public, ce qui explique de les embarquer tôt dans la communication.

6. Découpage du projet en tâches (WBS)

Le WBS (Work Breakdown Structure) permet de décomposer le projet global en plusieurs tâches concrètes et gérables. Nous avons structuré notre WBS autour de quatre grands axes, qui s'occupent chacun d'un enjeu spécifique de l'organisation de la journée.

Tâche principale	Sous-tâches	Justification du découpage
1. Cadrage & Administration	- Validation par la direction - Suivi du budget - Etablissement du planning	Point de départ obligatoire : sans validation de la direction, rien ne peut avancer.
2. Programme & Intervenants	- Invitation des intervenants - Déroulement de la journée - Validation des supports J	Coeur de l'évènement : le contenu détermine la qualité perçue et les besoins logistiques.
3. Logistique & Technique	- Réservation des salles IUT - Commande matériel audiovisuel - Organisation accueil & sécurité	Tâches dépendantes du programme confirme : on ne peut pas réserver avant de savoir le format.
4. Communication & Mobilisation	- Création des supports de pub - Validation service communication - Diffusion campagne de promotion	Démarrage le plus tôt possible après validation, pour maximiser la visibilité sur 21 jours.

On les a découpés de cette manière pour montrer les vraies dépendances entre chaque tâche. On ne peut pas lancer la communication avant d'avoir le programme validé par la direction, et on ne peut pas inviter les intervenants avant de savoir ce qu'on veut organiser. Cette logique sera développée dans le prochain point.

7. Planification du projet et dépendances

Logique de séquençement

La planification repose sur la détection des dépendances entre chaque tâche. Certaines tâches empêchent les autres de continuer. Voici donc la logique suivie :

- On commence par établir le planning détaillé de la journée, car toutes les décisions qui suivent en sont dépendantes comme les intervenants invités, les salles nécessaires, le matériel à commander.
 - La recherche et la confirmation des intervenants ne peut démarrer qu'une fois le programme fini. C'est la tâche la plus longue et la plus incertaine.
 - La logistique et l'accueil/sécurité sont parallèles, puisqu'elles ne dépendent pas l'une de l'autre. La logistique prend 25 jours, l'accueil/sécurité seulement 17 elle a donc une marge de 8 jours.
 - La validation par la direction intervient une fois que la logistique et la sécurité soient prêtes. C'est un point de contrôle incontournable avant de lancer la communication.
 - La communication démarre après la validation. On a prévu 21 jours de diffusion, pour avoir un impact suffisant sur la mobilisation.
 - L'évènement lui-même clôture la chaîne le 14 mai.
-

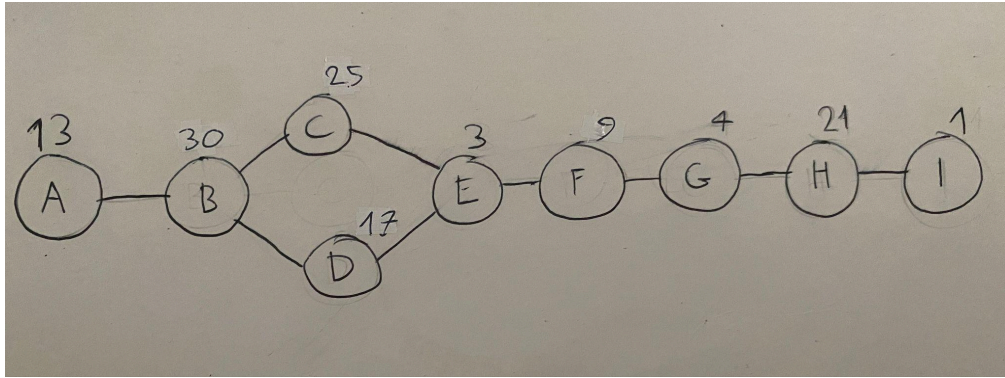


Tableau des taches (base du diagramme PERT)

Tâche	Intitulé	Durée (jours)	Dépendance(s)
A	Planning détaillé de la journée	13	—
B	Recherche et confirmation des intervenants	30	A
C	Logistique (salles, matériel audiovisuel)	25	B
D	Accueil et sécurité	17	B
E	Validation par la Direction de l'IUT	3	C, D
F	Création des supports de communication	9	E
G	Validation par le service communication	4	F
H	Diffusion de la campagne de promotion	21	G
I	Lancement de la journée le 14 mai	1	H

Chemin critique et marge

La durée totale de ce chemin est de 106 jours.

La tâche d'accueil/sécurité est parallèle à la logistique mais plus courte car elle dispose d'une marge de 8 jours, ce qui veut dire qu'elle peut être décalée sans mettre en danger la date finale.

Ce chemin critique montre deux points de vigilance majeurs :

- La tâche B est la plus longue et la plus risquée. Un retard ici décale tout le reste. C'est pourquoi nous avons prévu des plans de secours dès le départ.
- La tâche H ne laisse aucune marge. Si la validation de la communication prend du retard, la campagne sera raccourcie et la mobilisation du public en partira directement.

8. Budget prévisionnel et arbitrages réalisés

Répartition budgétaire

Le budget total alloué par la Direction est de 2000 euros. Voici comment nous l'avons répartie, et surtout pourquoi.

Poste de dépense	Montant	Justification
Matériel audiovisuel	700 euros	C'est la somme la plus importante qui garantit la qualité technique des présentations et ateliers.
Sécurité	350 euros	C'est une obligation liée au format événementiel en établissement public.
Intervenants / bénévoles	150 euros	Pour dédommager les bénévoles engagés
Communication	150 euros	Pour renforcer la visibilité dans les couloirs de l'IUT.
Lots pour les activités	100 euros	Pour attirer du lode à l'évènement et le rendre plus intéressant
Marge de sécurité	550 euros	Réserver pour tout imprévu logistique, technique ou humain le jour J.
TOTAL	2000 euros	1450 euros, utilisé et 550 euros.

Les arbitrages réalisés

Gérer un budget signifie qu'il faut faire des choix difficiles. Voici les principaux :

- Il n'y aura pas de restauration car c'est le poste qui aurait coûté le plus cher. En y renonçant, on priorise la qualité technique et la marge de sécurité. Après tout, le repas ne gâchera pas l'objectif pédagogique de la journée.
 - Pas de salle externe car louer une salle municipale ou un amphithéâtre externe aurait coûté trop cher. En utilisant les locaux de l'IUT c'est non seulement gratuit, mais aussi plus logique avec la nature de l'événement.
 - On a priorisé les intervenants externes gratuits ou quasi-gratuits, l'INR intervient généralement sans facturation dans les universités publiques et la Fresque du Numérique peut demander 100 à 200 euros, que nous avons gardés. Grâce à ça, on a accès à des intervenants de qualité sans trop peser sur le budget.
 - Et avec la marge de sécurité de 450 euros, nous avons intelligemment gardé cette réserve plutôt que de la dépenser. Un imprévu peut toujours survenir le jour J.
-

9. Analyse des risques et modalités de suivi

Même avec une bonne planification, des incertitudes persistent. Nous avons identifié cinq risques majeurs, théorisé leur probabilité et leur impact, et défini des actions préventives.

Même avec notre planification, l'organisation de cette journée universitaire aura tout de même des incertitudes. On a donc identifié les risques majeurs et défini des actions préventives avec des indicateurs pour les suivre.

Tout d'abord, concernant pour le public et l'audience le risque principal est une faible mobilisation des étudiants, ce qui rendrait l'événement ridicule, on estime le risque à une probabilité moyenne mais un impact très fort. Pour prévenir cela, on a prévu d'offrir des lots à gagner grâce à un budget dédié de 100 €, tout en lançant notre campagne de communication très tôt, soit 21 jours à l'avance. Le suivi de ce risque se fera grâce à l'engagement sur les réseaux sociaux de l'IUT et en demandant à des professeurs de faire des petits rappels pendant leurs cours.

Ensuite, concernant les ressources humaines, nous faisons face au risque qu'un intervenant clé annulé à la dernière minute, comme un animateur de la Fresque du Numérique c'est une probabilité faible mais avec impact fort. Pour prévoir cela, nous allons réserver en amont des professeurs de l'IUT capables d'animer un atelier de secours dans ce cas de figure. Nous allons aussi effectuer un suivi grâce à des appels téléphoniques réguliers avec chaque intervenant pour bien vérifier leur présence.

Sur le côté financier, il existe un risque de dépassement de budget lié à des frais cachés de logistique ou de sécurité le jour J, on estime que la probabilité est très faible. Notre action préventive a été de garder volontairement une marge de sécurité de 550 € sur notre total de 2000 € afin d'assurer n'importe quel imprévu.

Enfin pour le côté matériel et logistique, il pourrait y avoir une panne de matériel audiovisuel pendant les conférences. Pour limiter ce risque, nous devons nous assurer en amont de la compatibilité technique de tous ces éléments et de prévoir des câbles de secours. Le suivi sera de programmer un test complet de l'ensemble des équipements 1 semaine avant l'événement.

Ce travail d'anticipation a changé notre façon de voir le projet : plutôt que de subir les imprévus, nous avons pu les intégrer dans notre planification et notre budget dès le départ. La marge de 450 euros n'est pas un reliquat, c'est une décision consciente issue de cette analyse.

10. Bilan prévisionnel et retour réflexif

En conclusion, avec l'arrivée du jour J, 14 mai, notre projet de "Journée Universitaire sur le Numérique Responsable" est très positif, qui respecte l'ensemble des contraintes imposées par la Direction de l'IUT.

- Sur le plan financier : Nous avons entièrement respecté la contrainte du budget avec succès. Sur les 2 000 € alloués, nos dépenses totales s'élèvent à 1450 €. Avec notre reste de 550 € on a une excellente marge de sécurité, qui prouve notre capacité à gérer nos coûts.
- Sur le plan temporel : La date non négociable du 14 mai est respectée. Avec notre modélisation en réseau PERT, on a pu identifier dans quel ordre nous attaquerons le projet et intégré les délais à respecter.
- Sur le plan de la qualité : Les choix réalisés comme l'absence de restauration pour le public nous ont permis de concentrer nos efforts sur la qualité des interventions et du matériel, pour garantir un événement crédible, maîtrisé et conforme aux valeurs de l'université.

Ce projet a été très formateur pour nous, surtout parce que nous devions piloter cet événement sans autorité hiérarchique sur les services de l'IUT logistique et communication ou avec les intervenants.

Nous avons pu grâce aux nombreux outils appris lors de nos cours de gestion de projet, largement améliorer notre projet :

- La création du WBS et de la matrice RACI nous a permis de bien répartir les rôles de chacun. Plutôt que de donner des ordres, nous avons agi comme chef d'orchestre, en montrant à chaque service ce que l'on attendait de lui et à quel moment pour une meilleure organisation et légitimité.
- Pour être un bon chef de projet on ne peut pas tout accepter et on doit renoncer à certaines dépenses comme les repas ou l'achat de matériel en plus. ça a été difficile mais nécessaire pour garantir la globalité de la journée.
- Grâce à l'analyse des risques cela a changé notre vision du projet. Au lieu de subir les imprévus, nous avons pu les budgétiser (avec un marge de 550 €) et préparer des plans de secours comme les intervenants internes de remplacement.

Cette démarche structurée nous a permis de passer d'une simple idée d'événement à un plan d'action réaliste, chiffré et prêt à être déployé.

11. Contribution individuelle et prise de recul personnelle

Contribution de Yvon CHEN :

Dans ce binôme, j'ai surtout pris en charge la structuration temporelle donc emploi du temps et l'organisation du projet. J'ai réalisé le découpage en tâches (WBS) et conçu le diagramme de PERT, ce qui m'a permis d'identifier notre chemin critique. J'ai aussi géré la coordination avec le service de communication et défini les délais de validation pour nos 21 jours de promotion.

Ce projet m'a montré la difficulté de gérer un projet sans autorité hiérarchique et j'ai compris qu'un chef de projet ne donne pas des ordres, mais utilise des outils pour convaincre les autres acteurs d'avancer. D'un point de vue personnel, j'ai appris à mieux anticiper les blocages au lieu de réagir trop vite.

Ce travail se mélange très bien avec nos autres modules de communication professionnelle et d'organisation, car il montre que la théorie de la négociation est vraiment pratique.

Contribution de Achour Hamou Yahia :

Personnellement, je me suis concentré sur la gestion des contraintes financières et l'anticipation des problèmes. J'ai moi même géré notre façon de répartir notre argent par rapport au budget prévisionnel de 2000 euros et c'est moi qui ai proposé de supprimer la restauration pour avoir une marge de sécurité de 550 euros. J'ai aussi construit la matrice d'analyse des risques et choisi les plans de secours.

J'ai réalisé qu'en gestion de projet, prendre des décisions c'est souvent faire le choix de renoncer à d'autres choses quand j'ai pris la décision de couper la dépense de restauration pour sécuriser l'événement j'ai compris comment justifier mes choix face à une Direction. En tant que futur professionnel, cela m'a montré l'importance d'avoir toujours un plan B.

Ce projet nous confronte à la réalité financière d'une organisation et nous a permis d'apprendre à gérer une équipe de plusieurs personnes pas seulement en leur disant quoi faire mais en calibrant parfaitement chaque détail.
